


鬼怒川の堤防等の整備について

～ 整備手順 ～

○「鬼怒川緊急対策プロジェクト」として平成32年度完成を目指して堤防等を整備します。

- ・決壊箇所の堤防整備は6月末までに完成予定。
- ・溢水箇所の堤防整備は先行して着手し、下流への影響を考慮しながら段階的に整備。
- ・漏水箇所の堤防整備は災害復旧事業により平成28年度末までに整備。
- ・その他の堤防整備、河道掘削などは基本的に下流から実施。

(大形橋※から下流のブロックは平成30年度末まで、上流のブロックは平成32年度末までの完成を予定)

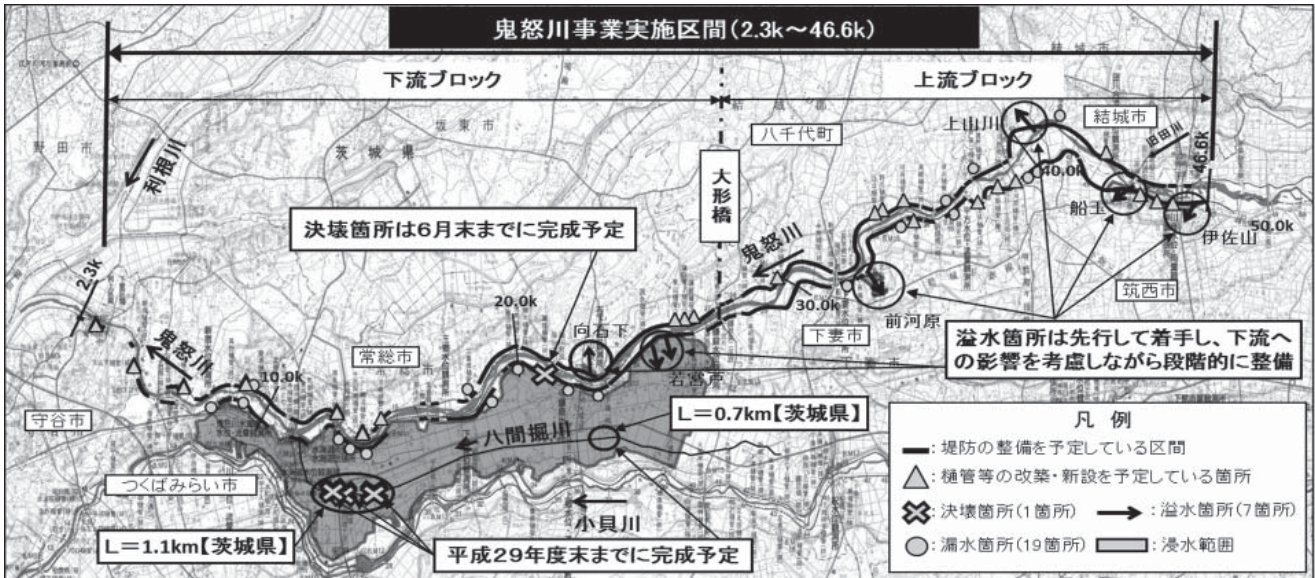

※大形橋の場所: 鬼怒川 27.4k 付近 (右岸: 下妻市別府地先、左岸: 下妻市鎌庭地先)

～ 概略の工事工程 (鬼怒川) ～

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
決壊箇所		施工				
漏水箇所		施工				
溢水箇所	大規模な溢水を生じた箇所	用地取得 施工(下段) (H27.9洪水の水位程度まで盛土)	施工(上段) (下段盛土の沈下状況等を確認の上上段盛土を施工)			
	その他の溢水箇所	用地取得	施工(下段) (H27.9洪水の水位程度まで盛土)	施工(上段) (下段盛土の沈下状況等を確認の上上段盛土を施工)		
下流ブロック	用地取得の必要のない箇所		施工			
	用地取得が必要な箇所		物件補償・用地取得	施工 (用地取得の出来た箇所から順次施工)		
上流ブロック	用地取得の必要のない箇所			施工		
	用地取得が必要な箇所		物件補償・用地取得	施工 (物件補償・用地取得の出来た箇所から順次施工)		
河道掘削			施工(掘削した土砂を築堤に利用)			

○漏水被害が発生したつくばみらい市細代地区については、降雨の影響で川の水位が上昇しやすくなる出水期(6~10月)までに、漏水防止のための遮水矢板工を施工し、平成28年度末までに災害復旧工事を終了する予定です。

【お問い合わせ】

■国土交通省関東地方整備局下館河川事務所
激甚災害対策特別緊急事業推進室
☎ 0296 - 25 - 2173

■茨城県土木部河川課鬼怒川流域緊急対策推進室
☎ 029 - 301 - 4491

■つくばみらい市総務部安心安全課
☎ 58 - 2111 (内線 2502)

※詳しくは、下館河川事務所のホームページをご覧ください。
<http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/>
